

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA PROIECTELOR FINANȚABILE PRIN POR 2014 - 2020. LECȚII ÎNVĂȚATE DIN EXPERIENȚA POR 2007-2013



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

- *„Orice om poate greși, dar numai cel fără minte stăruie în greșeală”- Cicero*
- *„Un om trebuie să fie destul de mare să-și recunoască greșelile și suficient de deștept ca să învețe din ele” -Alphonse Allais*



Tematica

1

- Programul Operațional Regional 2014-2020: elemente de noutate, mecanismul de depunere și evaluare a proiectelor.

2

- Etapele pregătirii unui proiect în contextul POR 2014-2020

3

- Lecții învățate din experiența POR 2007-2013: Greșeli frecvente în întocmirea documentației și motive de respingere a proiectelor

4

- Pregătirea documentelor pentru depunerea proiectelor pe POR 2014 - 2020: completarea cererii de finanțare și a anexelor aferente

5

- Documentația tehnico-economică în contextul depunerii proiectelor spre finanțare din POR 2014 - 2020. Proiectare cu execuție: avantaje și dezavantaje.

6

- Lecții învățate din experiența POR 2007-2013: pregătirea documentațiilor de achiziție publică; principalele cauze ale corecțiilor financiare.

7

- Lecții învățate din experiența POR 2007-2013: greșeli în implementarea și monitorizarea proiectelor

Axa prioritară (AP)	Activități	Alocare (Mil. Euro - FEDR)	Beneficiari
AP 1 - Transfer tehnologic	crearea, modernizarea, extinderea, dotarea entităților de ITT,	20,66	Entități de transfer tehnologic
AP 2 – Competitivitate IMM	construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare	66,74	IMM
AP 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon	eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, iluminat public;	83,89	UAT orașe și municipii
	transport public urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)	84,96	
AP 4 – Dezvoltare urbană	transport public urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)	112,69	Reședintele de județ: Arad, Deva, Reșița, Timișoara
	reconversia funcțională și/ sau reutilizarea terenurilor abandonate și neutilizate	12,52	
	Regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc., terenuri de sport, străzi urbane și utilități de bază la scară mică.	5,89	
	infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice).	7,65	


Axa prioritară (AP)	Activități	Alocare (Mil. Euro)	Beneficiari
AP 5 – Regenerare urbană și patrimoniu cultural	restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural	24,99	UAT, ONG, Unități de cult
	reconversia funcțională și/ sau reutilizarea terenurilor abandonate și neutilizate	9,18	UAT
AP 6 – Infrastructură de transport rutier	modernizarea/reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu rețeaua TEN T	81,13	Consilii Județene
AP 7 – Turism	dezvoltarea infrastructurii de turism din stațiunile turistice	9,94	UAT stațiune turistică
AP 8 – Infrastructură sanitară și socială	reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de sănătate	35,69	UAT, ONG (furnizori)
	reabilitare/ modernizare infrastructură socială	11,89	
AP 9 – Comunități marginalizate (CLLD)	Acțiuni integrate prin: investiții în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale, locuințe sociale, activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat	10,02	GAL
AP 10 – Infrastructura educațională	reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație: creșe, grădinițe, școli cu clasele I-VIII, licee tehnologice, școli profesionale, universități de stat	26,16	UAT, Universități
AP 11 – Cadastru	Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale; Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;	national	ANCPI
AP 12 – Asist. tehnică	Sprijin pentru AM și organisme intermediare (ADR –uri)		AM, OI
Total POR Regiunea Vest (FEDR)		604,00 (aprox 705 mil total)	5

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

- Un Ghid General POR 2014-2020

(www.adrvest.ro, www.inforegio.ro)

- îndrumar pentru pregătirea tuturor proiectelor
- se adresează tuturor potențialilor solicitanți, indiferent de prioritatea de investiții, indiferent de apelul de proiecte

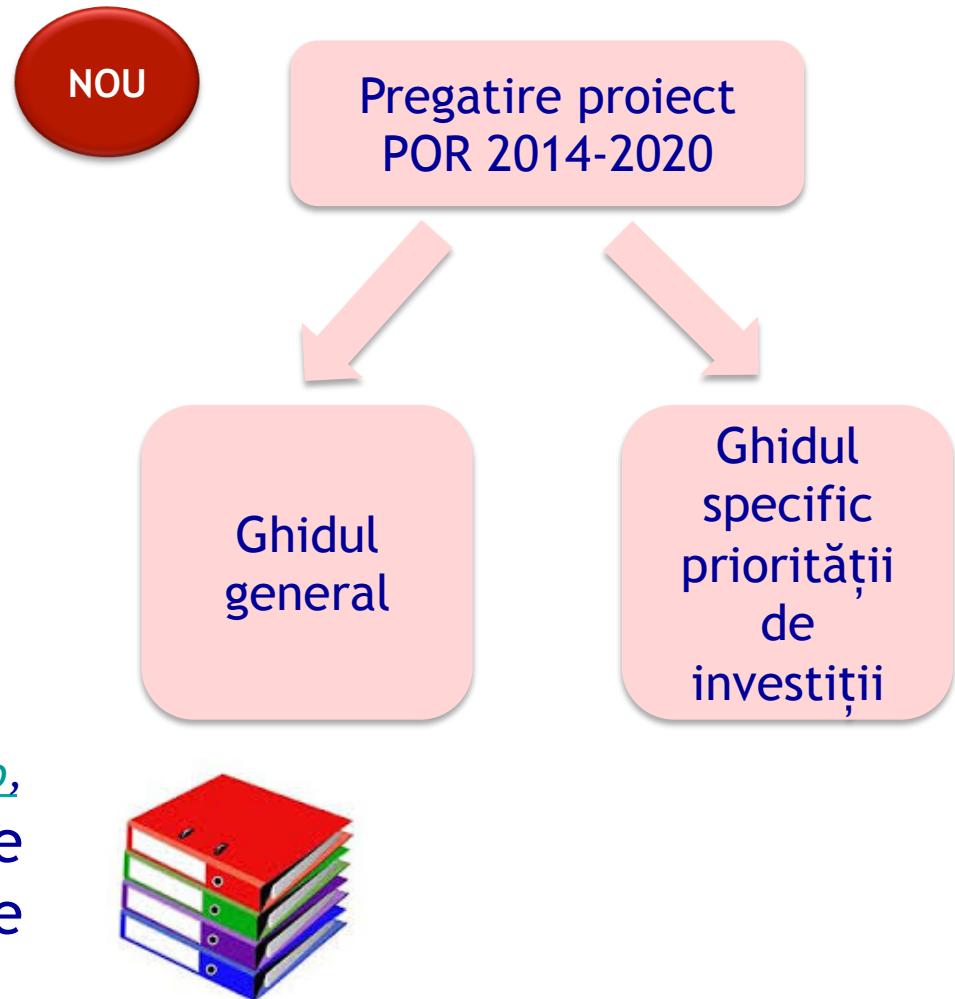

- Ghiduri specifice (www.adrvest.ro, www.inforegio.ro) pentru fiecare prioritate de investiții și apel de proiecte

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

- Apeluri competitive de proiecte
 - Termen limită de depunere
 - Contractarea în funcție de praguri de calitate
 - Sub punctajul minim (50 puncte) - proiectele sunt respinse automat
 - Punctaj peste pragul de calitate (ex 80 puncte): contractate
 - Se contractează până la acoperirea alocării financiare - se va publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare

NOU



Șanse crescute au proiectele depuse în primele luni (conform ghidurilor specifice) și care obțin un punctaj peste pragul de calitate (ex 80 pct)



Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

- Scurtarea procesului de evaluare și selecție: număr etape și durată

NOU

1. Verificarea
conformității
administrative și a
eligibilității



2. Evaluarea
tehnică și
financiară -
include și vizita la
fața locului



3. Etapa de
precontractare

1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității

Lipsă integrală anexă obligatorie

Lipsă pagină din anexă obligatorie

Nerespectarea modelelor standard, nesemnarea de către reprezentantul legal

Necompletarea tuturor rubricilor din Cererea de finanțare

Nu conteaza “importanța” documentului/ paginii lipsă

**POR 2014 - 2020 =
RESPINGERE
PROIECT**

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

NOU

2. Evaluarea tehnică și financiară - include și vizita la fața locului

- Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor axei prioritare/priorității de investiție
- Concordanța cu documentele strategice relevante în cadrul POR
- Calitatea, maturitatea, sustenabilitatea
- Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea
- Complementaritatea cu alte investiții
- Capacitatea financiară și operațională a solicitantului
- Concentrarea strategică a investițiilor



A se urmări criteriile din grila de evaluare tehnică și financiară (anexă la ghidurile specifice).

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

2. Evaluarea tehnică și financiară - include și vizita la fața locului

- realizată în cadrul ADR Vest de o echipă de evaluatori independenți
- ADR Vest: președinția și secretariatul comisiei



- Vizită la locul de implementare a obiectivului investiției: scop -stabilirea concordanței între situația din documentele analizate și cea din teren



Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate


3. Etapa precontractuală

- proiectele finanțabile în urma evaluării tehnice și financiare
- se vor transmite anexele obligatorii pentru această etapă, precum și soluționarea observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară



Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

Evaluare competitivă



Evaluare fără clarificări/
cu clarificări minimale



Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

Etapa evaluare	POR 2007 - 2013	POR 2014-2020
Conformitate administrativă și eligibilitate	3 clarificări - orice aspect din grila de CAE (mai puțin documente lipsă)	1 clarificare: •numerotarea eronată •opis întocmit greșit •neștampilarea anumitor pagini •nemenționarea conformității cu originalul •nesemnarea uneia sau mai multor pagini de către reprezentantul legal al solicitantului •corespondența dintre originalului cererii de finanțare cu formatul PDF al acesteia
Evaluare tehnică și financiară	2 clarificări - orice aspect din grila de ETF	1 clarificare: •buget incorect calculat din punct de vedere aritmetic •necorelarea bugetului cu activitățile proiectului și cu planul de achiziții •necorelarea calendarului de activități cu planul de achiziții •declararea anumitor cheltuieli ca fiind neeligibile și reasumarea acestora de către solicitant, •necorelări de informații în diferite părți ale cererii de finanțare, care să nu afecteze principiile de competitivitate în cadrul procesului, depunând în mod corespunzător.
Total	5 clarificări	2 clarificări

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

- Abordare strategică - încadrarea în documente strategice

NOU



Pentru anumite tipuri de proiecte încadrarea în strategii este obligatorie (condiție de eligibilitate), pentru altele se va acorda punctaj suplimentar - a se consulta Ghidul general POR 2014-2020 și ghidurile specifice



PI	Document strategic obligatoriu
3.1	PAED (Plan de Actiune privind energia Durabila)/ Strategie de reducere a CO2/ Strategie locala in domeniul energiei/ Alte doc strategice care prevad masuri in domeniul eficientei energetice)
3.2	Plan de Mobilitate
4.1	Plan de Mobilitate Strategie Integrata de Dezvoltare urbana
4.2	Strategie Integrata de Dezvoltare urbana
4.3	Strategie Integrata de Dezvoltare urbana
4.4	Strategie Integrata de Dezvoltare urbana
5.1	
5.2	
6	Strategia de Dezvoltare Regională
7	Strategia de Dezvoltare Locală
8	
9	Strategia de Dezvoltare Locală CLLD
10	

Se punctează
suplimentar:

Încadrarea în strategiile
de dezvoltare locală –
ATENȚIE a se actualiza
strategiile locale

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

- Extrasul de Carte Funciară - obligatoriu
(pe majoritatea PI - a se consulta și ghidurile specifice)

NOU



Toata suprafața pe care se intervine prin proiect trebuie acoperită prin documente de proprietate.

Toate documentele de proprietate trebuie să fie corelate între ele



Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

- Contractarea la nivel de SF/ DALI

NOU



Existența unor documente suplimentare care dovedesc maturitatea se punctează în plus:

Proiectul
Tehnic

Autorizați
a de
construire

Lansarea în SEAP a
anunțului de
atribuire a ctr. de
lucrări

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

Opțiunea 1:
**PT elaborat
împreună cu SF/
DALI - același
proiectant**

- costuri mai mici dacă se licitează împreună
- corelare între documente (SF/ DALI vs PT) → probleme mai mici în implementare
- începerea implementării efective imediat după contractare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

Opțiunea 2:
**PT elaborat după
semnarea
contractului de
finanțare**

- întârzierea începerii execuției lucrărilor (până se licitează și se elaborează PT-ul), după semnarea contractului de finanțare
- posibile diferențe față de SF/ DALI
 - *rezilierea proiectului (dacă soluțiile tehnice nu sunt corelate, dacă valoarea diferă cu > de 10%*
 - *probleme în implementare*

Programul Operațional Regional 2014-2020 - elemente de noutate

Opțiunea 3: **Proiectare cu execuție**

- riscul ca beneficiarul să nu aibă capacitatea (resurse umane pregătite) de a controla constructorul



Mulțumesc pentru atenție!

www.adrvest.ro

e-mail: office@adrvest.ro

tel/fax: 0256 / 491981, 491923

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.
